ANEXOS

ANEXO A – FORMULÁRIOS MODELO PADRÃO DEOP-MG

F01 – FICHA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE GERAL DA OBRA/SERVIÇO

F02 – RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO

F03 – RELATÓRIO TÉCNICO DEMANDA

F04 – RELATÓRIO FOTOGRAFICO OBRA/SERVIÇO

F05 – NOTIFICAÇÃO OBRA/SERVIÇO

F06 – RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL OBRA/SERVIÇO

F07 – REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA OBRA/SERVIÇO

F08 – ADEQUAÇÃO PLANILHA ORIGINAL DA OBRA/SERVIÇO

F09 – RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO - FINALIDADE ADITIVO DE PRAZO

F10 – RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO - FINALIDADE ADITIVO DE VALOR

F11 – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP)

F12 – TERMO DE ENTREGA DA OBRA/SERVIÇO (TEO)

F13 – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)

F14 – MODELO ATA DE REUNIÃO

DEOP - MG

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE OBRAS DOBR / DEOP-MG | **DATA**

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE GERAL DA OBRA/SERVIÇO

CÓDIGO MUNICÍPIO	CÓDIGO OBRA INFO	CÓDIGO CADÊ / SIGED

TEMÁTICA		**CLIENTE**		**STATUS**		
RESPONSÁVEIS	**GERENTE**	ENGº.	**CREA** Nº.	**MASP**	**ORIGEM DOS RECURSOS**	
	FISCAL	ENGº.	**CREA** Nº.	**MASP**		
OBRA/SERVIÇO					**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
MUNICÍPIO			**REGIÃO**			
ENDEREÇO						

LICITAÇÃO	**Nº. LICITAÇÃO**	**DATA DA LICITAÇÃO**	**DATA DA HOMOLOGAÇÃO**	**VALOR DE REFERÊNCIA**	**MÊS DE REFERÊNCIA**	**VALOR DA PROPOSTA**	**PERCENTUAL DE DESCONTO**	**EMPREITADA POR**
								PREÇO

CONTRATO	**Nº. CONTRATO**	**DATA DO CONTRATO**	**DATA DA PUBLICAÇÃO**	**PRAZO DE VIGÊNCIA**	**PRAZO DE EXECUÇÃO**	**DATA ORDEM DE INÍCIO**	**TÉRMINO DA VIGÊNCIA**	**TÉRMINO DA EXECUÇÃO**	**VALOR DO CONTRATO (Po)**
				dias	dias				

CONTRATADA	**EMPRESA**		TEL.		**ART DA OBRA**	
	ENDEREÇO		TEL.		Nº.	
	R.T.		CREA Nº.		DATA	

SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	
IMÓVEL TOMBADO PELO PATRIMÔNIO	
FEDERAL	
ESTADUAL	
MUNICIPAL	
ALVARÁ	
Nº.	

ADITIVO Nº.	**DATA**	**PRAZO ADITADO (dias)**			**NOVA DATA TÉRMINO**		**NOVO PRAZO (dias)**		**VALOR ADITADO**		**VALOR CONTRATO + VALOR ADITADO**
		VIGÊNCIA	**EXECUÇÃO**	**%**	**VIGÊNCIA**	**EXECUÇÃO**	**VIGÊNCIA**	**EXECUÇÃO**	**R$**	**%**	
TOTAL ADITADO		dias	dias						-	-	

ÁREA DO EMPREENDIMENTO	
CONSTRUÇÃO	**m²**
AMPLIAÇÃO	**m²**
REFORMA	**m²**
VALOR FINAL DA OBRA	
Po	
Po + R	
CUSTO OBRA / m²	

REGISTRO PARALISAÇÃO DA OBRA

Nº.	**DATA DA PARALISAÇÃO**	**DATA DO REINÍCIO**	**DIAS PARALISADOS**	**NOVA DATA TÉRMINO**	
				VIGÊNCIA	**EXECUÇÃO**
TOTAL DIAS PARALISADOS			-		

SEGURO DA OBRA (APÓLICES)

ACIDENTES PESSOAIS	INICIAL		**RISCOS ENGENHARIA**
	de	até	
	ENDOSSO		
	de	até	
	VALOR	VALOR	

DIÁRIO DE OBRA

Nº.	DATA

CONCLUSÃO FINAL DA OBRA

DATA		
PRAZO DE EXECUÇÃO		dias
TERMO ENTREGA DA OBRA/SERVIÇO		
DATA **TEO**		
TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO		
DATA **TRP**		
TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO		
DATA **TRD**		

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE OBRAS	DATA
DOBR / DEOP-MG	

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE GERAL DA OBRA/SERVIÇO

CÓDIGO MUNICÍPIO	CÓDIGO OBRA INFO	CÓDIGO CADÊ / SIGED

Nº. DA MEDIÇÃO	PERÍODO		VALOR DA MEDIÇÃO (Po)	VALOR DO REAJUSTE	VALOR TOTAL (Po + R)	VALOR MEDIDO (Po) ACUMULADO	VALOR REAJUSTE ACUMULADO	SALDO CONTRATUAL (Po)	ESTÁGIO DA OBRA %	
	de	a							MEDIDO	ACUMULADO
TOTAL										

REAJUSTAMENTO

FÓRMULA SIMPLES ou PARAMÉTRICA

DEVIDO A PARTIR DE:

$$R = \frac{I1 - Io}{Io} \times V$$

I1 = ÍNDICE MÊS DO FATO GERADOR DO EVENTO

Io = ÍNDICE MÊS REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO

V= VALOR DA MEDIÇÃO A SER REAJUSTADA

ÍNDICES FORNECIDOS PELO INCC - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV

COLUNA ESPECÍFICA	DESCRIÇÃO	PESO

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO	
	VÁLIDO POR 01 ANO

ATESTADO TÉCNICO

ATESTADO PARCIAL	
EMITIDO EM	
ATESTADO DEFINITIVO	
EMITIDO EM	

OBS.:

DEOP - MG

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO

DIRETORIA	
DOBR	
CÓDIGO	
MUNICÍPIO	OBRA

DATA

TEMÁTICA		**PROGRAMA**	
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.	CREA Nº.	
GERENTE	ENGº.	CREA Nº.	
OBRA/SERVIÇO		REGIME DE EXECUÇÃO	
		PREÇO	
MUNICÍPIO		REGIÃO	
ENDEREÇO			
CONTRATADA	EMPRESA		
	R.T. ENGº.	CREA Nº.	

CONTRATO	Nº.	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO	PRAZO VIGÊNCIA	PRAZO EXECUÇÃO	DATA ORDEM INÍCIO
				dias	dias	

SITUAÇÃO	TERMINO VIGÊNCIA	TÉRMINO EXECUÇÃO	PRAZO TOTAL ADITADO (dias)				NOVA DATA TÉRMINO		NOVA DATA TÉRMINO	
			VIGÊNCIA		EXECUÇÃO		VIGÊNCIA		EXECUÇÃO	
	ÚLTIMA PARALISAÇÃO		DATA PARALISAÇÃO		DATA REINÍCIO		TOTAL DIAS PARALISADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL	
	Nº.						dias		- dias	

VALOR CONTRATO (Po)	MÊS REF. (Io)	VALOR ADITADO (Po)	% ADITADO	VALOR CONTRATO + VALOR ADITADO	VALOR MEDIDO ACUMULADO (Po)	% EXECUTADO

REAJUSTE SOBRE VALOR MEDIDO AC	VALOR TOTAL MEDIDO (Po + R)	SALDO CONTRATO (Po)	REAJUSTE PREVISTO	SALDO CONTRATO (Po + R)	VALOR FINAL PREVISTO

FINALIDADE	

DEOP-MG

FISCAL DA OBRA	GERENTE DA OBRA
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura

DIRETOR DE OBRAS	
APROVO:	
carimbo e assinatura DATA	

DEOP - MG	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS			DIRETORIA
				DOBR
				CÓDIGO
	RELATÓRIO TÉCNICO DEMANDA	MÊS	ANO	DEMANDA SIGED

TEMÁTICA		
CLIENTE		
RESPONSÁVEL	ENGº.	CREA Nº.
OBJETO		
MUNICÍPIO		REGIÃO
ENDEREÇO		
FINALIDADE	PRESTAR INFORMAÇÕES / ESCLARECIMENTOS	

(FORMULÁRIO A SER UTILIZADO NOS CASOS DE INFORMAÇÃO TÉCNICA A SER PRESTADA AO DIRETOR DECORRENTE DE VISITA TÉCNICA / VISTORIA / OUTROS, CUJO OBJETO DA INFORMAÇÃO (OBRA/SERVIÇO) AINDA NÃO FOI CONTRATADO PELO DEOP-MG)

DEOP-MG

ENGº. RESPONSÁVEL	GERENTE DA ÁREA
	CIENTE:
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura

DIRETOR DE OBRAS

APROVO:

carimbo e assinatura DATA

DEOP - MG	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS		DIRETORIA	
			DOBR	
			CÓDIGO	
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OBRA/SERVIÇO	DATA DA VISITA	MUNICÍPIO	OBRA

TEMÁTICA			
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.	CREA Nº.	
GERENTE	ENGº.	CREA Nº.	
OBRA/SERVIÇO			
MUNICÍPIO			
ENDEREÇO			
CONTRATADA			

DESCRIÇÃO FOTO 1		**DESCRIÇÃO FOTO 2**	
DESCRIÇÃO FOTO 3		**DESCRIÇÃO FOTO 4**	

DEOP - MG	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIRETORIA	
		DOBR	
	NOTIFICAÇÃO OBRA/SERVIÇO	CÓDIGO	
		MUNICÍPIO	OBRA

TEMÁTICA			
CLIENTE			
FISCAL	Engº.	CREA Nº.	
GERENTE	Engº.	CREA Nº.	
OBRA/SERVIÇO			
MUNICÍPIO			
ENDEREÇO			
CONTRATADA			

CONTRATO	Nº. CONTRATO	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	PRAZO DE EXECUÇÃO
				dias	dias
	VALOR CONTRATO Po	MÊS REF. (Io)	DATA ORDEM DE INÍCIO	TERMINO VIGÊNCIA	TÉRMIINO EXECUÇÃO

SITUAÇÃO	PRAZO TOTAL ADITADO		NOVA DATA TÉRMINO		VALOR ADITADO (Po)	%	VALOR CONTRATO + VALOR ADITADO
	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO			
	dias	dias					
	VALOR MEDIDO	% EXECUTADO	VALOR REAJUSTE		VALOR TOTAL (PO + R)		SALDO CONTRATUAL (Po)
	PARALISAÇÃO	DATA DA PARALISAÇÃO	DATA DE REINÍCIO		DIAS PARALISADOS	NOVA DATA	
						VIGÊNCIA	EXECUÇÃO
	Nº.						

Fica essa empresa notificada a providenciar, a correção dos serviços abaixo relacionados, referentes à obra acima referenciada, no prazo máximo de ... (.....) dias corridos, contados da data de recebimento Notificação.

Belo Horizonte, .. de ..... de 201..

DEOP-MG		
FISCAL DA OBRA	**GERENTE DA OBRA**	**DIRETOR DE OBRAS**
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura	carimbo e assinatura

CONTRATADA	
carimbo e assinatura	DATA

DEOP - MG

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA	
DOBR	
CÓDIGO	

RELATÓRIO DESEMPENHO MENSAL OBRA/SERVIÇO

MÊS	ANO	MUNICÍPIO	OBRA

TEMÁTICA		**PROGRAMA**	
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.	CREA Nº.	
GERENTE	ENGº.	CREA Nº.	
OBRA/SERVIÇO		REGIME DE EXECUÇÃO	
		PREÇO	
MUNICÍPIO		REGIÃO	
ENDEREÇO			

LICITAÇÃO	N º.	DATA	DATA HOMOLOGAÇÃO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR PROPOSTA	MÊS REF. (Io)	% DE DESCONTO

CONTRATADA	EMPRESA		
	R.T.	ENGº.	CREA Nº.

CONTRATO	Nº.	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO	PRAZO VIGÊNCIA	PRAZO EXECUÇÃO	DATA ORDEM INÍCIO
				dias	dias	

TERMINO VIGÊNCIA	TÉRMINO EXECUÇÃO	PRAZO TOTAL ADITADO (DIAS)				NOVA DATA TÉRMINO		NOVA DATA TÉRMINO	
		VIGÊNCIA		EXECUÇÃO		VIGÊNCIA		EXECUÇÃO	

ÚLTIMA PARALISAÇÃO		DATA PARALISAÇÃO	DATA REINÍCIO	TOTAL DIAS PARALISADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL	
Nº.						dias

SITUAÇÃO DO CONTRATO


VALOR CONTRATO (Po)	VALOR ADITADO (Po)	% ADITADO	VALOR CONTRATO + VALOR ADITADO	MEDIÇÃO ATUAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO		VALOR DA MEDIÇÃO	% MEDIDO
				Nº.		a		

VALOR MEDIDO ACUMULADO (Po)	% EXEC.	REAJUSTE SOBRE VALOR MEDIDO AC	VALOR TOTAL MEDIDO (Po + R)	SALDO CONTRATO (Po)	PREVISÃO REAJUSTE	SALDO CONTRATO (Po+R)	VALOR FINAL PREVISTO

STATUS	**OBRA EM ANDAMENTO**	**FAROL**	☺

QUADRO GRÁFICO	VALOR	%
P1 - PLANEJADO ATÉ O MOMENTO		
E - EXECUTADO ATÉ O MOMENTO		

IQP - ÍNDICE DE QUALIDADE DO PLANEJAMENTO (E/P_1) :

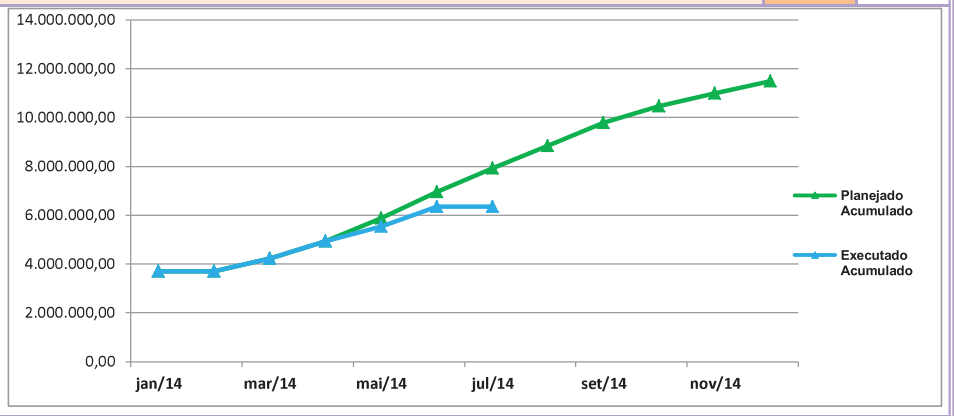

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	ATIVIDADES	%	ITEM	ATIVIDADES	%
01	Serviços preliminares		12	Carpintaria	
02	Trabalhos em terra		13	Revestimentos	
03	Fundação		14	Pisos	
04	Estrutura		15	Vidros	
05	Alvenaria		16	Pintura	
06	Cobertura		17	Limpeza	
07	Instalação hidro-sanitária		18	Muros externos e arrimos	
08	Instalação elétrica		19	Serviços complementares	
09	Instalações especiais		20	Quadra poliesportiva	
10	Cabeamento estruturado		21	Diversos	
11	Serralheria		22		

	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS			DIRETORIA
DEOP - MG				DOBR
				CÓDIGO
	RELATÓRIO DESEMPENHO MENSAL OBRA/SERVIÇO	MÊS	ANO	MUNICÍPIO OBRA

TEMÁTICA		**PROGRAMA**	
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.	CREA Nº.	
GERENTE	ENGº.	CREA Nº.	
OBRA/SERVIÇO		REGIME DE EXECUÇÃO	
		PREÇO	
MUNICÍPIO		REGIÃO	
ENDEREÇO			

RELATO VISITA TÉCNICA

FOTOS OBRA/SERVIÇO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
FOTO 4	FOTO 5	FOTO 6

DEOP-MG

ENGº. FISCAL	GERENTE DA OBRA	DIRETOR DE OBRAS
		DE ACORDO:
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura	carimbo e assinatura

DEOP - MG

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE OBRAS | **DOBR** | **CÓDIGO**

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA OBRA/SERVIÇO

MÊS	ANO	MUNICÍPIO	OBRA

RESPONSÁVEIS	**FISCAL**	**STATUS**
	GERENTE	
OBRA/SERVIÇO		**TEMÁTICA**
MUNICÍPIO		**CLIENTE**
CONTRATADA		

Nº. CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	MÊS REF. Io	DATA ORDEM DE INÍCIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	TÉRMINO EXECUÇÃO	PRAZO TOTAL ADITADO	NOVA DATA CONCLUSÃO	PARALISAÇÃO Nº	PARALISAÇÃO DATA	PARALISAÇÃO REINÍCIO	PARALISAÇÃO TOTAL DIAS PARALISADOS	PRAZO EXECUÇÃO TOTAL	
				dias		dias					dias	dias	

VALOR ADITADO	% ADITADO	VALOR CONTRATO + VALOR ADITADO	VALOR MEDIDO ACUMULADO (Po)	% EXEC.	VALOR REAJUSTE	VALOR TOTAL (1)	SALDO CONTRATO (Po)	REAJUSTE PREVISTO S/ SALDO	VALOR TOTAL (2)	ADITIVO PREVISTO (Po)	REAJUSTE ADITIVO PREVISTO	VALOR TOTAL (3)	VALO FINAL PREVISTO (1 + 2 + 3)

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MÊS	VALOR MEDIDO ATÉ DEZ/14	MEDIÇÃO REAL jan-15	MEDIÇÃO PREVISTA fev/15	MEDIÇÃO PREVISTA mar/15	MEDIÇÃO PREVISTA abr/15	MEDIÇÃO PREVISTA mai/15	MEDIÇÃO PREVISTA jun/15	MEDIÇÃO PREVISTA jul/15	MEDIÇÃO PREVISTA ago/15	MEDIÇÃO PREVISTA set/15	MEDIÇÃO PREVISTA out/15	MEDIÇÃO PREVISTA nov/15	MEDIÇÃO PREVISTA dez/15	TOTAL PREVISTO JAN - DEZ 2015	TOTAL PREVISTO P/ 2016
VALOR MEDIDO / A MEDIR															
VALOR DO REAJUSTE															
VALOR TOTAL															

DEOP-MG

FISCAL DA OBRA	GERENTE DA OBRA	DIRETOR DE OBRAS
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura	carimbo e assinatura

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA

DOBR

CÓDIGO

MUNICÍPIO | OBRA

ADEQUAÇÃO PLANILHA ORIGINAL DA OBRA/SERVIÇO

OBRA/ SERVIÇO:

MUNICÍPIO:

DATA

ITEM / CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PLANILHA CONTRATUAL				1ª ADEQUAÇÃO	1ª ADEQUAÇÃO										2ª ADEQUAÇÃO	3ª ADEQUAÇÃO	DIFERENÇA TOTAL	
							QUANTIDADES					VALOR								
		UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL		ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	SERVIÇOS EXTRAS	TOTAL	DIFERENÇA	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	SERVIÇOS EXTRAS	TOTAL	DIFERENÇA			QUANTIDADE	VALOR
	TOTAL PLANILHA CONTRATUAL																			
	TOTAL ACRÉSCIMOS																			
	TOTAL DECRÉSCIMOS																			
	TOTAL SERVIÇOS EXTRAS																			
	TOTAL GERAL																			
	PERCENTUAL																			

FORMULÁRIO PADRÃO DEOP-MG (F08)

1ª Via - PROCESSO 2ª Via - FISCAL

DEOP - MG

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA	
DOBR	
CÓDIGO	

RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO
FINALIDADE - ADITIVO DE PRAZO

Nº	DATA	MUNICÍPIO	OBRA

TEMÁTICA		**PROGRAMA**	
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.	CREA Nº.	
GERENTE	ENGº.	CREA Nº.	
OBRA/SERVIÇO		REGIME DE EXECUÇÃO	
		PREÇO	
MUNICÍPIO		REGIÃO	
ENDEREÇO			

LICITAÇÃO	N º.	DATA	DATA HOMOLOGAÇÃO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR PROPOSTA	MÊS REF. (Io)	% DE DESCONTO

CONTRATADA			
	EMPRESA		
	R.T.	ENGº.	CREA Nº.

CONTRATO

Nº.	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO	PRAZO VIGÊNCIA	PRAZO EXECUÇÃO	DATA ORDEM INÍCIO
			dias	dias	

TERMINO VIGÊNCIA	TÉRMINO EXECUÇÃO	PRAZO TOTAL ADITADO (DIAS)				NOVA DATA TÉRMINO		NOVA DATA TÉRMINO	
		VIGÊNCIA		EXECUÇÃO		VIGÊNCIA		EXECUÇÃO	

ÚLTIMA PARALISAÇÃO			TOTAL DIAS PARALISADOS	PRAZO REPOSTO	NOVA DATA TÉRMINO VIGÊNCIA	NOVA DATA TÉRMINO EXECUÇÃO
Nº.	DATA	DATA REINÍCIO				
			dias	dias		

VALOR CONTRATO (Po)	VALOR TOTAL ADITADO (Po)	% TOTAL ADITADO	VALOR CONTRATO + VALOR ADITADO	VALOR MEDIDO ACUMULADO (Po)	% EXECUTADO

REAJUSTE SOBRE VALOR MEDIDO AC	VALOR TOTAL MEDIDO (Po + R)	SALDO CONTRATO (Po)	PREVISÃO REAJUSTE	SALDO CONTRATO (Po + R)	VALOR FINAL PREVISTO

ADITIVO DE PRAZO

☐	ALTERAÇÃO DE PROJETO ou DE ESPECIFICAÇÕES	☐	INTERRUPÇÃO EXECUÇÃO DO CONTRATO OU DIMINUIÇÃO DO RITMO DE TRABALHO POR ORDEM DA ADMINISTRAÇÃO	☐	IMPEDIMENTO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR FATO OU ATO DE TERCEIRO
☐	ATRASO DE PROVIDÊNCIAS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO	☐	AUMENTO DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS NO CONTRATO	☐	SUPERVENIÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL

ÚLTIMO TA DE PRAZO	DATA ÚLTIMO TA DE PRAZO	PRAZO A ADITAR		PRAZO TOTAL PREVISTO (dias)		NOVA DATA TÉRMINO	
		VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO
Nº		dias	dias				

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS			DIRETORIA
				DOBR
				CÓDIGO
	RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO **FINALIDADE - ADITIVO DE PRAZO**	Nº	DATA	MUNICÍPIO OBRA

TEMÁTICA		**PROGRAMA**	
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.		CREA Nº.
GERENTE	ENGº.		CREA Nº.
OBRA/SERVIÇO			REGIME DE EXECUÇÃO
			PREÇO
MUNICÍPIO			REGIÃO
ENDEREÇO			

JUSTIFICATIVA TÉCNICA (Continuação)

Para: Diretor de Obras - DOBR

Sr. Diretor,

Com base na justificativa técnica acima, propomos o aditivo contratual para a Obra supra.

Fineza, caso de acordo, dar sequência p/ a formalização do respectivo Termo Aditivo -TA.

DEOP-MG

FISCAL DA OBRA	**GERENTE DA OBRA**
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura

DIRETOR DE OBRAS	
APROVO:	
carimbo e assinatura	DATA

DEOP - MG	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS			DIRETORIA
				DOBR
				CÓDIGO
	RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO **FINALIDADE - ADITIVO DE VALOR**	**Nº**	**DATA**	**MUNICÍPIO** / **OBRA**

TEMÁTICA		**PROGRAMA**	
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.	CREA Nº.	
GERENTE	ENGº.	CREA Nº.	
OBRA/SERVIÇO		REGIME DE EXECUÇÃO	
		PREÇO	
MUNICÍPIO		REGIÃO	
ENDEREÇO			

LICITAÇÃO	N º.	DATA	DATA HOMOLOGAÇÃO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR PROPOSTA	MÊS REF. (Io)	% DE DESCONTO

CONTRATADA	EMPRESA		
	R.T.	ENGº.	CREA Nº.

CONTRATO	Nº.	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO	PRAZO VIGÊNCIA	PRAZO EXECUÇÃO	DATA ORDEM INÍCIO
				dias	dias	

TERMINO VIGÊNCIA	TÉRMINO EXECUÇÃO	PRAZO TOTAL ADITADO (DIAS)		NOVA DATA TÉRMINO	NOVA DATA TÉRMINO
		VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO

ÚLTIMA PARALISAÇÃO			TOTAL DIAS PARALISADOS	PRAZO REPOSTO	NOVA DATA TÉRMINO VIGÊNCIA	NOVA DATA TÉRMINO EXECUÇÃO
Nº.	DATA	DATA REINÍCIO				
			dias	dias		

VALOR CONTRATO (Po)	VALOR TOTAL ADITADO (Po)	% TOTAL ADITADO	VALOR CONTRATO + VALOR TOTAL ADITADO	VALOR MEDIDO ACUMULADO (Po)	% EXECUTADO

REAJUSTE SOBRE VALOR MEDIDO AC	VALOR TOTAL MEDIDO (Po + R)	SALDO CONTRATO (Po)	PREVISÃO REAJUSTE	SALDO CONTRATO (Po + R)	VALOR FINAL PREVISTO

ADITIVO DE PRAZO

☐	ALTERAÇÃO DE PROJETO ou DE ESPECIFICAÇÕES	☐	INTERRUPÇÃO EXECUÇÃO DO CONTRATO OU DIMINUIÇÃO DO RITMO DE TRABALHO POR ORDEM DA ADMINISTRAÇÃO	☐	IMPEDIMENTO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR FATO OU ATO DE TERCEIRO
☐	ATRASO DE PROVIDÊNCIAS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO	☐	AUMENTO DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS NO CONTRATO	☐	SUPERVENIÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL

ÚLTIMO TA DE PRAZO	DATA ÚLTIMO TA DE PRAZO	PRAZO A ADITAR		PRAZO TOTAL PREVISTO (dias)		NOVA DATA TÉRMINO	
		VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO
Nº		dias	dias				

ADITIVO DE VALOR

☐	ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS	☐	DECRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS	☐	SERVIÇOS EXTRAS
☐	ACERTO DE PLANILHA	☐	MODIFICAÇÃO DO PROJETO ou DAS ESPECIFICAÇÕES PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA	☐	OUTROS

ÚLTIMO TA DE VALOR	DATA ÚLTIMO TA DE VALOR	VALOR CONTRATO + VALOR TOTAL ADITADO	VALOR A ADITAR	% A ADITAR FINANCEIRO	VALOR TOTAL PREVISTO (valor total + valor a aditar)	% TOTAL ADITADO + % A ADITAR
Nº						

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CÁLCULO DO PERCENTUAL DO ADITIVO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROCURADORIA CONSTANTE DA ORDEM DE SERVIÇO DEOP-MG Nº. 01 - 26/06/2012, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO TCU - Nº. 2.819, DE 25/10/2011.

QUADRO RESUMO	VALOR A ADITAR	CÁLCULO % A ADITAR		% JÁ ADITADO CONFORME TCU	% TOTAL ADITADO + % A ADITAR (CONFORME TCU)
		FINANCEIRO	P/ FINS DO TCU		
PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS					
PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRAS					
PLANILHA DE DECRÉSCIMO DE SERVIÇOS					
TOTAL					

	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS			DIRETORIA
DEOP - MG				DOBR
				CÓDIGO
	RELATÓRIO TÉCNICO OBRA/SERVIÇO **FINALIDADE - ADITIVO DE VALOR**	**Nº**	**DATA**	**MUNICÍPIO** **OBRA**

TEMÁTICA		**PROGRAMA**	
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.		CREA Nº.
GERENTE	ENGº.		CREA Nº.
OBRA/SERVIÇO			REGIME DE EXECUÇÃO PREÇO
MUNICÍPIO			REGIÃO
ENDEREÇO			

JUSTIFICATIVA TÉCNICA (Continuação)

Para complemento da frase escolher um das opções abaixo:

se Aditivo de Valor com impacto financeiro, solicitar autorização do Cliente para a formalização do respectivo Termo Aditivo -TA.

se Aditivo de Valor, sem impacto financeiro positivo, dar sequência p/ a formalização do respectivo Termo Aditivo -TA.

Ressalta-se que as alterações realizadas no projeto e/ou na obra, visam atender ao interesse público e não alteram o objeto contratual.
Além disso, os serviços extras decorrem de motivos supervenientes à data da contratação, sendo que os mesmos não eram previsíveis, nem previstos quando da abertura do processo licitatório.

Para: **Diretor de Obras - DOBR**

Sr. Diretor,

Com base na justificativa técnica acima, propomos o aditivo contratual para a Obra supra.

Fineza, caso de acordo,

DEOP-MG

FISCAL DA OBRA	**GERENTE DA OBRA**
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura

DIRETOR DE OBRAS	
APROVO:	
carimbo e assinatura	**DATA**

DEOP - MG	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIRETORIA	
		DOBR	
		CÓDIGO	
	TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - TRP	MUNICÍPIO	OBRA

TEMÁTICA		**PROGRAMA**	
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.	CREA Nº.	
GERENTE	ENGº.	CREA Nº.	
OBRA/SERVIÇO			
MUNICÍPIO			
ENDEREÇO			

CONTRATO	**Nº.**	**DATA ASSINATURA**	**DATA PUBLICAÇÃO**	**PRAZO DE VIGÊNCIA**	**PRAZO DE EXECUÇÃO**	**VALOR DO CONTRATO Po**	**DATA ORDEM DE INÍCIO**
				dias	dias		
	DATA DE CONCLUSÃO FINAL DA OBRA		**PRAZO DE EXECUÇÃO FINAL**	**VALOR DA OBRA (Po)**	**VALOR DO REAJUSTE**	**VALOR FINAL DA OBRA (Po+R)**	
			dias				

CONTRATADA	**EMPRESA**	
	CNPJ	
	R.T.	

Recebemos em nome do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG, CGC - 23.971.203 / 0001 - 20, a obra acima referenciada, nos termos do art. 73 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº. 8.666/1993.

Após vistoria, atestamos que os serviços estão de acordo com o Contrato supracitado, com os Projetos , Especificações e com as Normas Técnicas pertinentes.

O presente termo é válido provisoriamente pelo prazo de **até 90 (noventa) dias.**

Belo Horizonte, .. de ..... de .... .

DEOP-MG

FISCAL	GERENTE	DIRETOR DE OBRAS
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura	carimbo e assinatura

CONTRATADA

R.T.	
	carimbo e assinatura

	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIRETORIA	
DEOP - MG		DOBR	
		CÓDIGO	
	TERMO DE ENTREGA DA OBRA/SERVIÇO - TEO	MUNICÍPIO	OBRA

TEMÁTICA		**PROGRAMA**	
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.		CREA Nº.
GERENTE	ENGº.		CREA Nº.
OBRA/SERVIÇO			
MUNICÍPIO			
ENDEREÇO			

LICITAÇÃO	Nº.	DATA	VALOR REFERÊNCIA	MÊS REF. (Io)	DATA HOMOLOGAÇÃO	REGIME DE EXECUÇÃO
						PREÇO

CONTRATO	Nº.	DATA DA ASSINATURA	DATA DA PUBLICAÇÃO	PRAZO DE VIGÊNCIA	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR DO CONTRATO (Po)	DATA ORDEM DE INÍCIO
				dias	dias		
	DATA DE CONCLUSÃO FINAL DA OBRA		PRAZO DE EXECUÇÃO FINAL	VALOR DA OBRA (Po)	VALOR DO REAJUSTE	VALOR FINAL DA OBRA (Po+R)	
			dias				

CONTRATADA	EMPRESA	
	CNPJ	
	R.T.	

TIPO DE OBRA	**VISTORIAS PREVISTAS**		DATA LIMITE P/ RECLAMAÇÃO
	Nº. VISTORIAS	ÚLTIMA VISTORIA	
☐ CONSTRUÇÃO ☐ REFORMA ☐ AMPLIAÇÃO		DATA:	

CLIENTE

Declaro que, nesta data, recebemos a obra acima identificada e que providenciaremos a sua utilização de acordo com os fins a que se destina, comprometendo-nos a comunicar ao DEOP-MG, até a data limite indicada acima, quaisquer defeitos de funcionamento que porventura possam ser detectados nesse periodo.

Declaro ainda, que somos responsáveis, a partir desta data, pela vigilância da unidade pública em referência.

LOCAL E DATA	
ÓRGÃO / ENTIDADE	
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO	carimbo e assinatura

DEOP-MG

FISCAL	GERENTE	DIRETOR DE OBRAS
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura	carimbo e assinatura

	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIRETORIA	
DEOP - MG		DOBR	
		CÓDIGO	
	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD	MUNICÍPIO	OBRA

TEMÁTICA		**PROGRAMA**	
CLIENTE			
FISCAL	ENGº.	CREA Nº.	
GERENTE	ENGº.	CREA Nº.	
OBRA/SERVIÇO			
MUNICÍPIO			
ENDEREÇO			

CONTRATO	**Nº.**	**DATA ASSINATURA**	**DATA PUBLICAÇÃO**	**PRAZO DE VIGÊNCIA**	**PRAZO DE EXECUÇÃO**	**VALOR DO CONTRATO (Po)**	**DATA ORDEM DE INÍCIO**
				dias	dias		
	DATA DE CONCLUSÃO FINAL DA OBRA		**PRAZO DE EXECUÇÃO FINAL**	**VALOR DA OBRA (Po)**	**VALOR DO REAJUSTE**	**VALOR FINAL DA OBRA (Po+R)**	**DATA DO TRP**
			dias				

CONTRATADA	**EMPRESA**	
	CNPJ	
	R.T.	

Recebemos em nome do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG, CGC - 23.971.203 / 0001 - 20, a obra acima referenciada, nos termos do art. 73 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº. 8.666/1993.

Após vistoria, atestamos que os serviços estão de acordo com o Contrato supracitado, com os Projetos, Especificações e com as Normas Técnicas pertinentes.

O presente termo é válido definitivamente, sem prejuízo do artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Belo Horizonte, .. de ..... de .... .

DEOP-MG

FISCAL	GERENTE	DIRETOR DE OBRAS
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura	carimbo e assinatura

CONTRATADA

R.T.	
	carimbo e assinatura

NÃO PREENCHER EM CASO DE OBRA EM CONVÊNIO

DPGF

Autorizo a devolução das cauções, conforme normas do Contrato.

..../..../..... .....
carimbo e assinatura


Valor das cauções retiradas em :

☐ - Espécie	R$ .....
☐ - Carta Fiança	R$ .....
☐ - Outros	R$ .....

GERENCIA CONTÁBIL

Cauções devolvidas em: ...../...../.....

.....
carimbo e assinatura



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE REUNIÃO

	DATA	

OBRA/SERVIÇO	
MUNICÍPIO	
OBJETIVO	

LOCAL	

PARTICIPANTES

	ÓRGÃO / ENTIDADE	SETOR	NOME	TELEFONE E-MAIL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

ASSUNTOS ABORDADOS: Pendências de medi ões :

- 14º Medição: Não foi executado nenhum item da comunicação visual na unidade.
- 13º Medição segue analise:

• Item 1.09/1.10 - Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime para fachada: a pintura da fachada da unidade não será executada pela Catalunha.

• Item 15.03 – Pintura superfície galvanizada com antioxidante: A pintura foi executada porém o guarda corpo já encontra, em alguns pontos, com oxidação.

- 1º Medição Aditivo 2:

• Item 5.03 – Cabo telefônico: Ainda não foi executada a parte de telefonia no 1° pavimento

ASSUNTOS RESOLVIDOS:

	PENDÊNCIAS / AÇÃO	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	DATA LIMITE P/ SOLUÇÃO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

DEOP-MG - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Prédio Minas – 7º andar
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte – Minas Gerais CEP 31630-900
Telefones: (31) 3915-3912 – 3915-3914
dobr@deop.mg.gov.br - www.deop.mg.gov.br
